

Opbygning tribune

For sikre at tribunen er opbygget korrekt og følger certificeringen skal denne tjekliste udfyldes og indsendes når opbygningen er fuldenendt.


Lokation for opstilling af tribune:

København

Sander

Anonymous

1 Billede af den fulde opsætning *

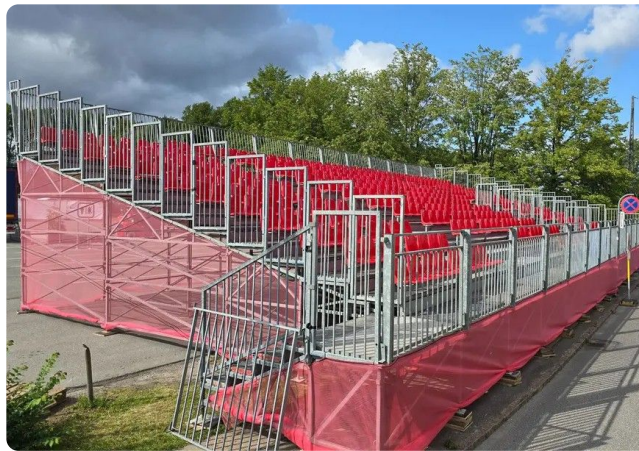

2 Dokumentér at spindelfødderne står korrekt *

Description

Afhængigt af hvad underlaget er, kan det være der skal gøres noget ekstra for at sikre stabilitet.

1. Asfalt - Træplader under fødderne for at fordele trykket og undgå skader

Picture proof




3 Er tribunen hævet? *

- ☐ Nej. Den starter i gulvniveau
- ☒ Ja. Den er hævet et enkelt lag
- ☐ Ja. Den er hævet to lag

4 Er der firkantede afstandsstykker i sektioner længst til venstre? *

Description

Hvis der kigges ind på bagsiden skal der i det fag længst til venstre være firkanter med skråstiver i stedet for den almindelige trekant.

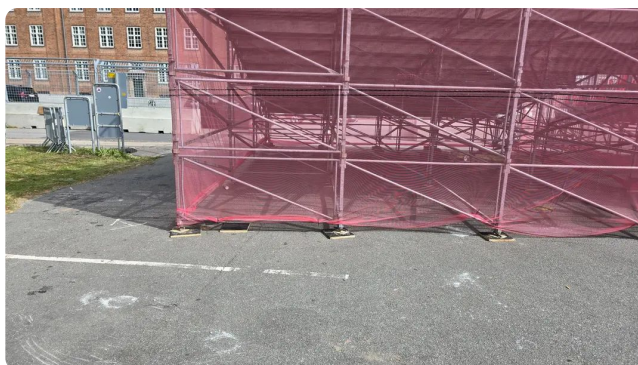

5 Hvordan lever opstillingen op til krav og regler? *

- ☒ Den følger certificering
- ☒ Den er opstillet så den ikke overstiger antal pladser mellem udgange
- ☒ Den er opstillet så der er brand-/flugtveje rundt omkring

6

Ekstra kommentarer

Lejer har godkendt opsætning
